



Informe ejecutivo N° 1, revisión 0

Edificio Torre 4, Lote 18

Septiembre 2026

Cierre del período: 30-09-2026

Cliente

Proyecta Gestión

Constructora

CIH

Tipo de contrato

Administración

Código de proyecto

GIP_340

Superficie

48.533,67 m²

Plazo contractual

**31-08-2026 al
28-02-2029**



Vista general, septiembre 2026

Dónde está la obra al cierre de septiembre 2026

Con el 3,3% del plazo transcurrido, aún no hay línea base para medir el avance físico: el programa de obra gruesa está en elaboración. Se ha pagado el 3,4% del contrato y el avance financiero es de 4,7%.



Plazo transcurrido

Día 30 de 912



3,3%

Avance programado

Programa contractual

S/I

Avance ejecutado

Avance real en terreno

S/I

Pagado del contrato

Estados de pago y anticipos



3,4%

Avance financiero

Rendiciones acumuladas



4,7%

Semáforo de gestión

Rojo	Avance físico vs programa Sin línea base: el programa de obra gruesa está en elaboración
Rojo	Avance financiero vs físico Avance financiero 4,7% sin avance físico medido para contrastar
Rojo	Consumo de plazo Plazo transcurrido 3,3% (día 30 de 912) sin avance físico medido
Verde	Cierre de RDI Tasa de cierre 100%: 12 de 12 RDI resueltas, sin pendientes
Verde	Seguridad (accidentabilidad vs industria) Accidentabilidad 0,55% vs 2,72% de la industria
Rojo	Conciliación de recursos obra vs EEPP Sin inventario de alzaprimas y moldajes para conciliar

Antecedentes del contrato

Contrato por administración con CIH, por 1.474.598 UF IVA incluido y un plazo de 912 días. Restan 882 días para el término.

Constructora	CIH	Fecha de inicio	31-08-2026
Descripción de la obra	Edificio Torre 4, Lote 18	Fecha de término	28-02-2029
Tipo de contrato	Administración	Plazo de ejecución	912 días
Tipo de obra	Construcción	Días restantes	882 días
Código	GIP_340	Plazo transcurrido	3,3%
Superficie	48.533,67 m²	Monto del contrato (IVA incl.)	1.474.598 UF

Pólizas de seguro

Aseguradora	Nº de póliza	Materia asegurada	Monto	Vigencia
Contempora	120131531	Responsabilidad civil	60.000,00 UF	05-08-2026 al 15-06-2029
Mapfre	En trámite	Todo riesgo de construcción	1.286.157,99 UF	05-08-2026 al 15-06-2029

La vigencia incluye el período de mantenimiento.


Avance físico

El programa de obra gruesa está en elaboración por parte de la constructora, por lo que aún no hay línea base contra la cual medir el avance físico. Se informará desde el próximo período. Al 30-09-2026 ha transcurrido el 3,3% del plazo.

- Rojo: avance físico vs programa
- Rojo: consumo de plazo

Programado a la fecha S/I Programa en elaboración	Ejecutado a la fecha S/I Medición en terreno en proceso	Plazo transcurrido 3,3% Día 30 de 912
--	--	--

Hitos contractuales

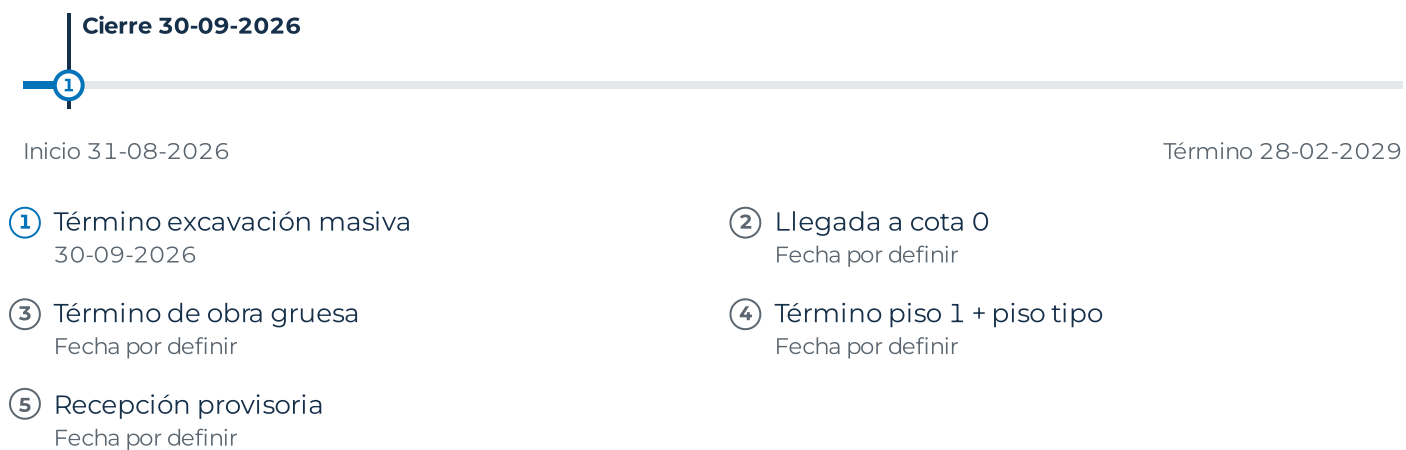


Fechas según contrato. Los hitos sin fecha se fijarán en el programa de obra; los hitos en azul ya se cumplieron.

Estado financiero del contrato

Se ha pagado el 3,4% del contrato (50.048 UF, incluidos 5.403 UF de anticipos). Quedan 1.424.550 UF por pagar.

● Rojo: avance financiero vs físico



Anticipos	Estados de pago	Saldo por pagar
5.403 UF	44.645 UF	1.424.550 UF
0,4% del contrato	3,0% del contrato	96,6% del contrato

Detalle del contrato

Concepto	UF	Pesos	% del contrato
Monto total del contrato (IVA incl.)	1.474.598 UF	\$ 60.272.374.687	100,0%
Monto neto del contrato	1.239.158 UF	\$ 50.649.054.359	84,0%
Costo directo	1.043.873 UF	—	70,8%
Gastos generales y utilidades	195.285 UF	—	13,2%
Anticipos pagados a la fecha	5.403 UF	—	0,4%
Pagado en estados de pago y anticipos	50.048 UF	\$ 2.009.458.424	3,4%
Saldo por pagar (IVA incl.)	1.424.550 UF	\$ 58.226.717.089	96,6%
Rendiciones acumuladas (IVA incl.)	68.630 UF	\$ 2.768.970.633	4,7%

Monto de contrato, neto y saldo en pesos a UF \$ 40.873,77 (valor UF del EEPP 9). Pagado y rendido en pesos según el valor UF de cada facturación.

Avance físico frente al financiero


Indicador	Valor	Referencia
Avance programado a la fecha	S/I	Programa de obra gruesa en elaboración
Avance ejecutado a la fecha	S/I	Medición en terreno en proceso
Desviación física	S/I	Requiere programa y medición en terreno
Avance financiero acumulado (rendiciones netas)	4,7%	Rendiciones netas sobre monto neto, hasta el EEPP 9
Brecha avance financiero vs físico	S/I	Sin avance físico medido para comparar
Pagado del contrato (EEPP y anticipos)	3,4%	
Plazo transcurrido	3,3%	Día 30 de 912

Estados de pago y rendiciones

En el período se emitió el EEPP 9 por 18.582 UF IVA incluido, con factura pendiente. Las rendiciones del mes suman \$ 759.512.209.

Estados de pago ordinarios 9 Último emitido: EEPP 9	Anticipos cursados 1 5.403 UF pagados	Estado de pago del período 18.582 UF EEPP 9, factura pendiente	Rendiciones del período \$ 759.512.209 IVA incluido
--	--	---	--

Monto por estado de pago y pagado acumulado

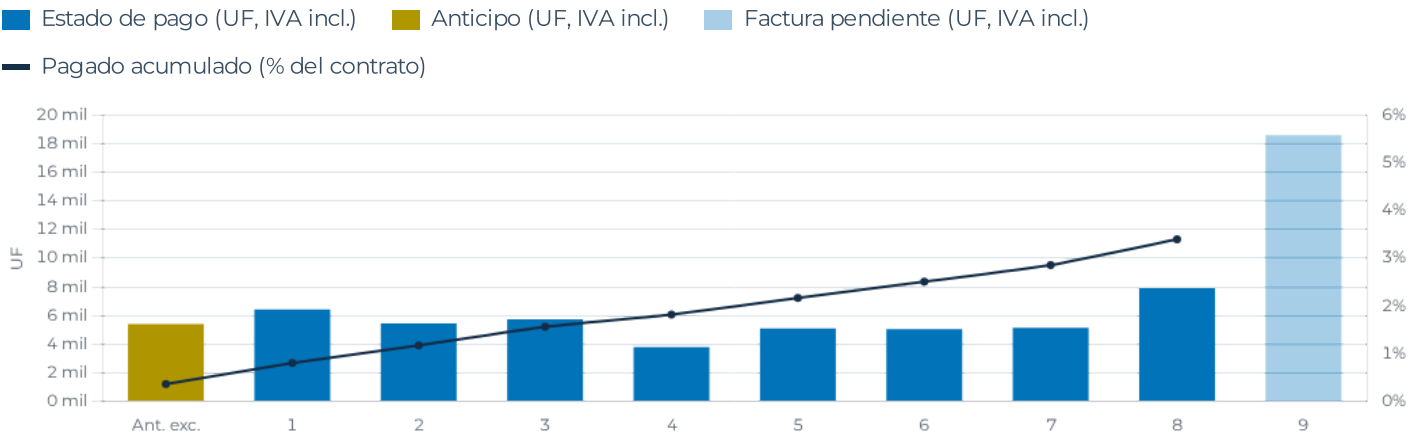

Concepto	UF	Detalle
Total neto facturado	42.057 UF	Anticipo y EEPP 1 a 8; el EEPP 9 tiene factura pendiente
IVA facturado	7.991 UF	19% sobre el neto
Total pagado (IVA incl.)	50.048 UF	3,4% del contrato
Rendiciones acumuladas (IVA incl.)	\$ 2.768.970.633	4,7% de avance financiero acumulado

Detalle de los 10 documentos de pago

Documento	Fecha	Factura	Neto (UF)	Valor UF	IVA (UF)	Total (UF)	Acum. % contrato
Anticipo exc.	—	6766	4.540,46	39.643,59	862,69	5.403,15	0,4%
EEPP 1	—	6793	5.400,75	39.727,96	1.026,14	6.426,89	0,8%
EEPP 2	—	6812	4.586,34	39.706,07	871,40	5.457,74	1,2%
EEPP 3	—	6827	4.819,20	39.790,63	915,65	5.734,85	1,6%
EEPP 4	—	6839	3.195,04	39.841,72	607,06	3.802,10	1,8%
EEPP 5	—	6859	4.288,71	40.120,20	814,85	5.103,56	2,2%
EEPP 6	—	6876	4.245,12	40.610,69	806,57	5.051,69	2,5%
EEPP 7	—	6894	4.329,27	40.820,31	822,56	5.151,83	2,9%
EEPP 8	—	6915	6.652,40	40.844,79	1.263,96	7.916,36	3,4%
EEPP 9	—	Pendiente	15.615,04	40.873,77	2.966,86	18.581,90	—
Total			42.057,29		7.990,89	50.048,18	3,4%

Estructura de costos rendidos

El gasto rendido acumulado equivale al 4,65% del monto del contrato.
El desglose por ítem de costo se incorporará cuando la constructora entregue el detalle de las rendiciones de Torre 4.

Gasto rendido acumulado 4,65% Del monto del contrato	Rendiciones acumuladas \$ 2.768.970.633 IVA incluido	Desglose por ítem Pendiente Detalle de rendiciones por entregar
---	---	--

Requerimientos de información (RDI)

De 12 RDI emitidas, 12 están resueltas (100,0%). No quedan RDI pendientes. Estado al 05-10-2026.

● Verde: cierre de RDI

RDI emitidas 12 Estado al 05-10-2026	Resueltas 12 Tasa de cierre 100,0%	Pendientes 0 0,0% del total	Abiertas vencidas 0 De 0 abiertas
---	---	--	--

Respuesta promedio
7,0 días
Entre consulta y respuesta

Distribución por especialidad

Arquitectura		3 25,0%
Cálculo		3 25,0%
Climatización		3 25,0%
Sanitaria		1 8,3%
Eléctrica		1 8,3%
Seguridad		1 8,3%
BMS		0 0,0%
Riego		0 0,0%
Proyecto		0 0,0%

Plazo de respuesta de las RDI resueltas

En plazo		12
Por vencer		0
Fuera de plazo		0

Clasificación de las 12 RDI resueltas según su plazo de respuesta.

Calidad de obra

Se recibieron fundaciones, muros y pilares del 9º subterráneo y la primera losa de cielo. Hubo una observación crítica en una pasada de losa, corregida sin impacto en plazo.

Revisiones del período

- Se revisan y reciben sellos de fundación y armaduras de fundaciones, verificando su correcta ejecución.
- Se reciben armaduras de muros y pilares del 9º subterráneo.

- Se reciben en conjunto al ITE moldajes, enfierradura, instalaciones y hormigonado de estructuras hasta losa de cielo 9° subterráneo, incluyendo pasadas en losas y muros para instalaciones.
- Se verifican en terreno instalaciones en losa y muro de obra gruesa.

Observaciones

Observación crítica del período

Se detecta un cajón de pasada en losa con una medida distinta a la indicada en el plano de pasadas.

Solución

Se corrige antes del hormigonado de la losa de cielo del 9° subterráneo, núcleo norte.

Impacto

La observación no tiene impacto en plazo, ya que fue detectada a tiempo.



Seguridad e higiene

La accidentabilidad de la obra (0,55%) está bajo la de la industria (2,72%). En el período se registró un accidente, con 9 días perdidos.

● Verde: seguridad (accidentabilidad vs industria)


Accidentes acumulados	Días perdidos acumulados	Último accidente
1	9	Septiembre 2026 9 días perdidos

Comparación con la industria

Indicador	Torre 4	Industria 2025	Brecha
Tasa de accidentabilidad (sep-26)	0,55%	2,72%	-2,17 pp
Días perdidos por accidente	9,0	24,6	-15,58 días
Tasa de siniestralidad (sep-26)	5,0	No informado	—

Fuente de industria: Industria construcción 2025, base estadística sobre seguridad social 2025. Siniestralidad = días perdidos del período / promedio anual de trabajadores × 100. Accidentabilidad = N° de accidentes del período / promedio anual de trabajadores × 100.

Cumplimiento D.S. N° 594 (servicios higiénicos)



Dotación de referencia: 388 personas por turno (edificios Uno, Tres y Cuatro, instalación de faenas compartida). Todos los servicios superan el mínimo exigido.

Recursos en obra frente a estados de pago

Aún no hay inventario en obra ni cantidades en EEPP para conciliar alzaprimas y moldajes.

● Rojo: conciliación de recursos obra vs EEPP

Recurso	En obra	En EEPP	Diferencia	%
Alzaprimas (un)	S/I	S/I	S/I	S/I
Moldaje losa (m²)	S/I	S/I	S/I	S/I
Moldaje muros (m²)	S/I	S/I	S/I	S/I

El comparativo se incorporará cuando la constructora entregue el inventario de recursos en obra y su detalle en los estados de pago.

Hitos y hechos relevantes del período

Hitos contractuales

- Hito contractual N° 1, término de excavación masiva: cumplido al 30-09-2026.
- Avance de obra en losa cielo 9° subterráneo.
- La constructora entrega a la inmobiliaria el presupuesto de obra por partidas para seguimiento mensual. Se define una reunión mensual para verificar avances, y la ITO debe validar los avances en terreno.
- La programación de obra gruesa y su seguimiento están en elaboración por parte de la constructora.

Hechos relevantes

- Con fecha 15-09-2026 se realiza la entrega consolidada, al 80%, de todas las especialidades a cliente y constructora.
- Se instalan 2 grúas en la obra de Torre 4.
- Se ejecuta la primera losa de cielo del 9° subterráneo.
- Se ajustan los planos de arquitectura del sector rampa, 8° y 9° subterráneo.

Registro fotográfico

18 fotografías del período, ordenadas desde el nivel más bajo hacia la cubierta. Seleccione una para ampliarla.



Piso -9
Excavación masiva



Piso -9
Sello de fundación



Piso -9
Enfierradura de fundación




Piso -9
Revisión de fundación



Piso -9
Fundación TDH



Piso -9
Armadura de muros y pilares

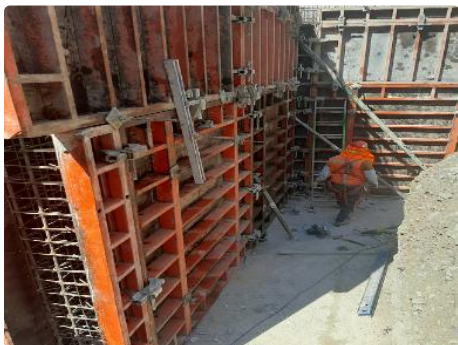

Piso -9
Moldaje de muros



Piso -9
Enfierradura de muro



Piso -9
Revisión de enfierradura de muro



Piso -9
Foso de parking



Piso -9
Bajada de ductos de bomba de hormigón



Piso -9
Vista general



Piso -9
Vista general 2



Losa cielo -9
Moldaje de losa



Losa cielo -9
Pasada en losa



Losa cielo -9
Pasada PCI




Losa cielo -9
Hormigonado de losa



Exterior
Vista general Torre 4

Accesos y gestión de camiones

La obra opera con 3 frentes de acceso controlados.

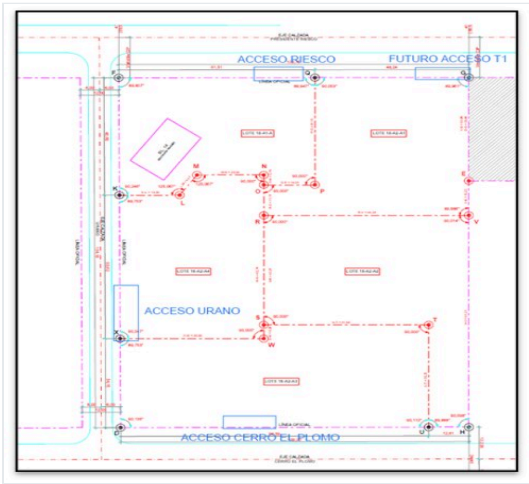


Plano de accesos habilitados.

Acceso	Vehículos	Personal	Control
Pdte. Riesco	Camión tolva y hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	2 accesos. Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería fija y jornal de lavado de ruedas.
Urano	Camión hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería móvil y jornal de lavado de ruedas.
Cerro El Plomo	Camión hormigón	2 paleteros, guardia y jornal de riego	Acceso controlado, paletero, jornal de riego, portería móvil y jornal de lavado de ruedas.

Fotografías de accesos



Pdte. Riesco
Acceso 1

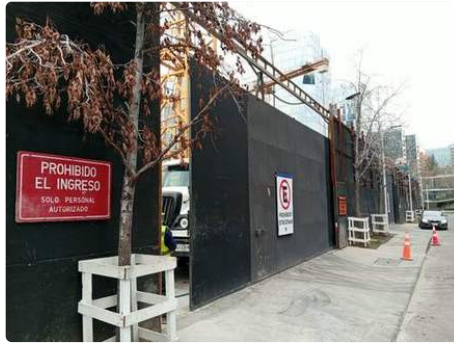

Urano
Acceso



Cerro El Plomo
Acceso



Pdte. Riesco
Acceso 2



Urano
Acceso



INSPECCIÓN TÉCNICA
DE OBRAS

GIP Inspección Técnica de Obras

Av. Vitacura 5250, oficina 507, Vitacura, Santiago

contacto@gip.cl

Informe ejecutivo N° 1, revisión 0

Edificio Torre 4, Lote 18 (GIP_340)

Período septiembre 2026, cierre 30-09-2026
